

WV Papierfabrik, Biberist Ausführungszeitraum Juni - Juli 2019

Kurzbeschreibung des Objektes

Bei der Wasser-Transportleitung vom Pumpwerk Eichholz zum Reservoir Oberholz wurden im Bereich der Emmenquerung Lecks festgestellt. Nach einer langen Planungs- und Ausschreibungsphase konnten wir die Bohrarbeiten Mitte Juni starten. Am 18. Juli 2019 wurde nach dem Erstellen der Bohrung die neue Polyethylenleitung DN 350 auf eindrücklicher Weise unter der Emme eingezogen. Die neue Transportleitung wird voraussichtlich gegen Ende Herbst 2019 in Betrieb genommen.

Auftraggeber

Einwohnergemeinde Biberist
Bernstrasse 4+6, Postfach 46

Projektverantwortlicher

Matthias Ulrich
032 671 26 30
matthias.ulrich@w-h.ch

Bohrlänge

- 1) 165 m
- 2) 115 m

Eingezogenes Rohr

- 1) HDPE DE 355 PN 16
- 2) HDPE DE 180 PN 16

Eingesetzte Gerätschaften

Bohranlage Vermeer D 36 x 50 II
Bagger Takeuchi TB 290
Generatoren
Mischanlagen

Bohrmeister

Pascal Frick
pascal.frick@schenkag.com
Bei Schenk AG Heldswil seit: 2015

Ingenieur / Bauleitung

W+H AG
Blümlisalpstrasse 6
Postfach
4562 Biberist

Endaufweitung

- 1) 450 mm
- 2) 300 mm

Anlagekosten

- 1) 169'266.20 CHF
- 2) 72'372.35 CHF

Geologie


Mergelfels
Kies
Emmenschotter
Sand

Projektleiter

Curdin Pinggera
Geschäftsleitung
071 642 37 42
curdin.pinggera@schenkag.com
Bei Schenk AG Heldswil seit: 2010



Bohrverlauf

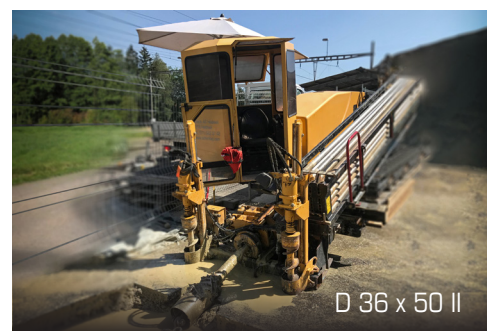

D 36 x 50 II



Eingezogene Rohre
